

草加市社会資本整備総合交付金 評価委員会

新田駅周辺地区における 都市基盤整備



令和3年10月25日
都市整備部新田駅周辺土地区画整理事務所

目次

I 事業の概要

- 1 位置・所在
- 2 事業の概要(東口・西口)
- 3 これまでの経緯(東口・西口)
- 4 社会資本総合整備計画


II 事前評価結果について(区画整理事業・下水道事業)

- 1 事前評価について
- 2 事前評価 評価項目

III 事後評価について(区画整理事業・下水道事業)

- 1 事後評価について
- 2 事後評価 評価項目
- 3 今後の方針について

位置・所在

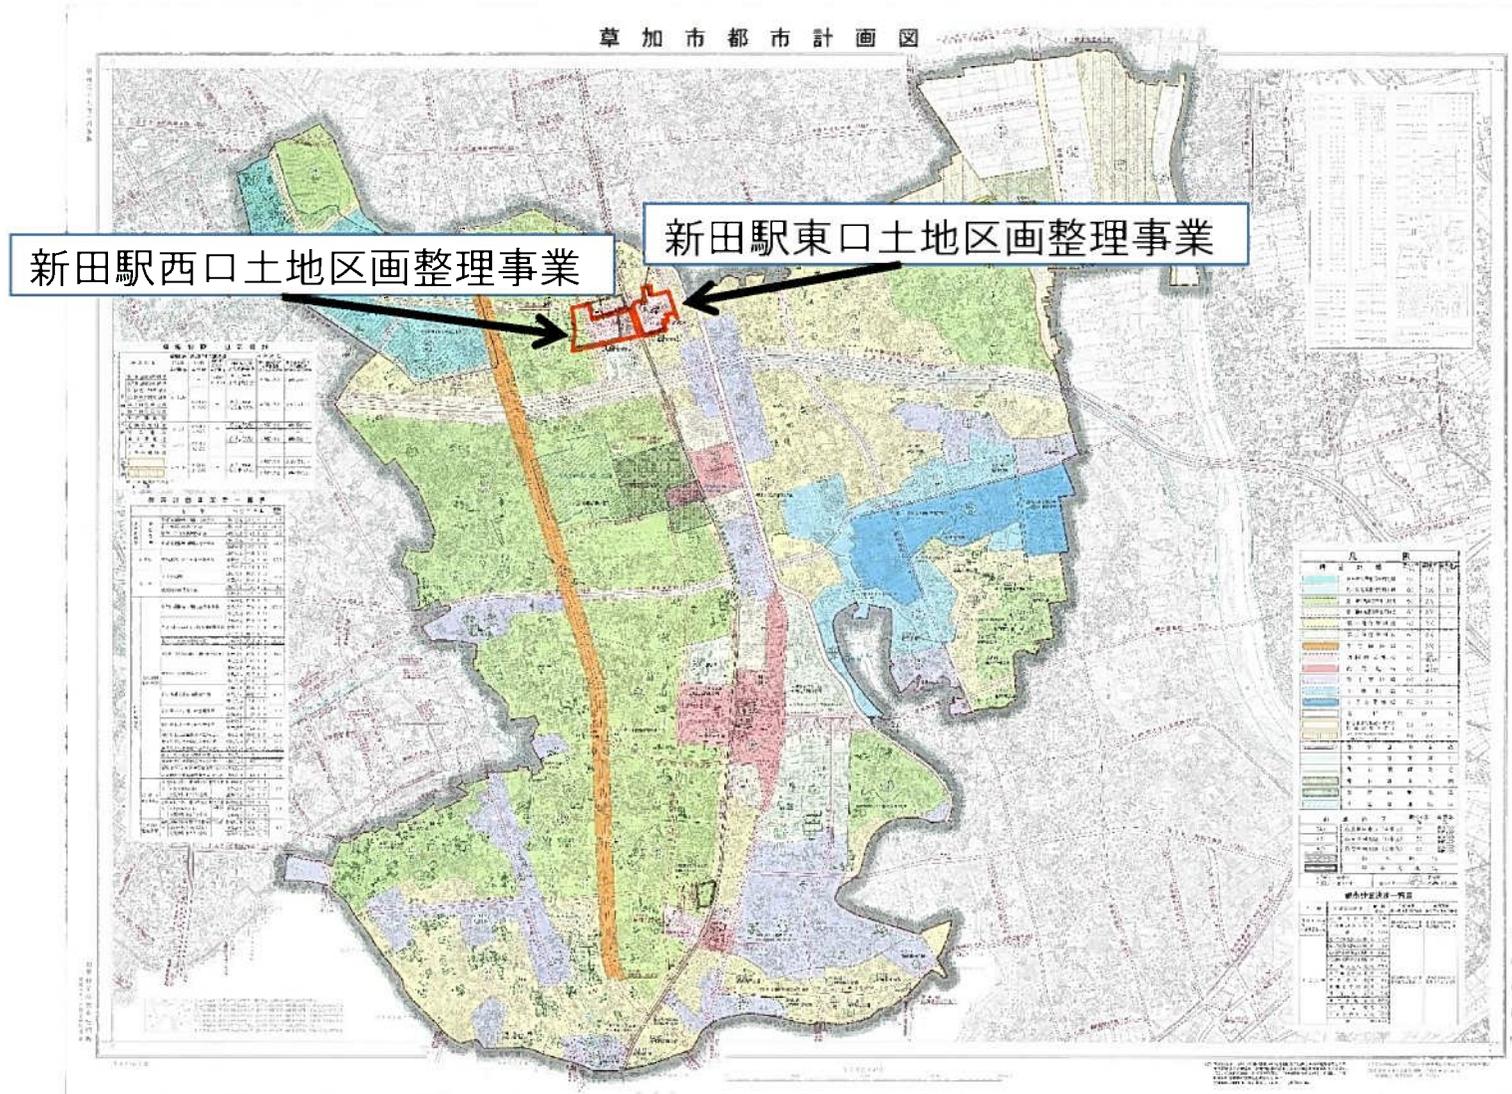


新田駅東口土地区画整理事業の概要

草加都市計画事業 新田駅東口土地区画整理事業 設計図

名称: 草加都市計画事業
 新田駅東口土地区画整理事業
 場所: 草加市金明町地内
 施行面積: 約6.3ha
 施行期間: H25~R13(清算期間5年を含む)
 事業費: 約100.3億円

移転棟数: 190棟
 道路整備延長: 2,158m

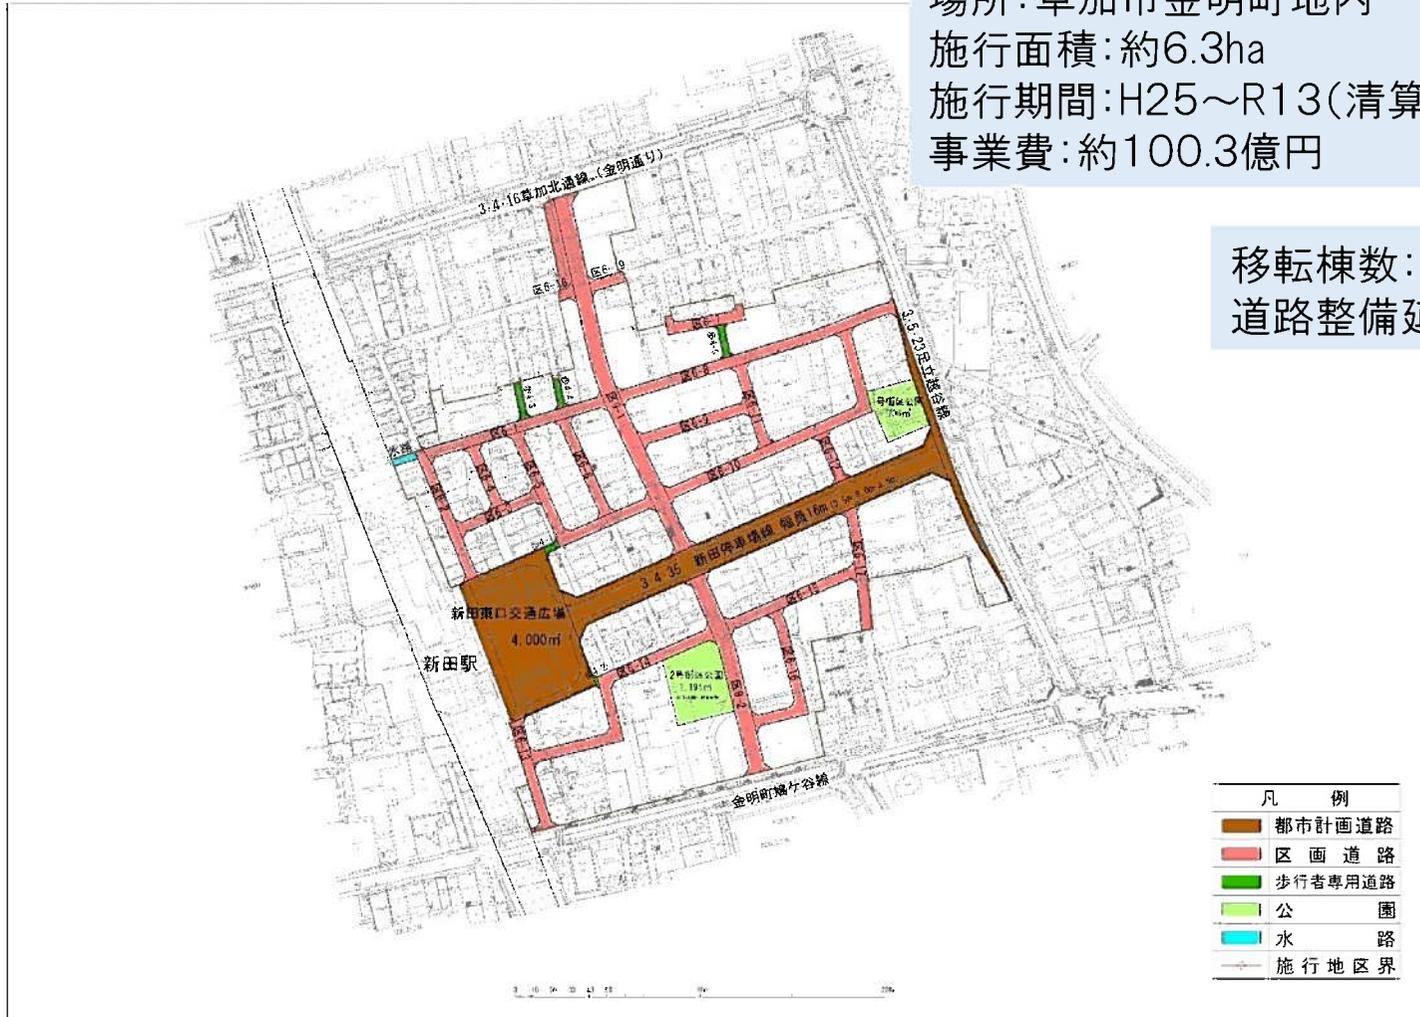

新田駅東口土地区画整理事業の経緯

| | |
|--------|---|
| 平成14年度 | 地元協議会によるまちづくり再スタート |
| 平成18年度 | まちづくり住民提案書による提案 |
| 平成19年度 | まちづくり基本計画(案)発表 |
| 平成24年度 | まちづくり基本計画(修正案)発表 |
| 平成24年度 | 都市計画決定 |
| 平成25年度 | 事業計画の許可・決定 |
| 平成26年度 | 審議会委員選挙と審議会設置 仮換地の供覧(個別説明) |
| 平成27年度 | 第1回仮換地指定(仮換地指定率約44%) |
| 平成28年度 | 第2回仮換地指定(仮換地指定率約90%) 移転に係る街区別説明会開催(駅通り南側) |
| 平成29年度 | 第3回仮換地指定(仮換地指定率約100%) 移転に係る街区別説明会開催(駅通り北側) |

※進捗率(令和3年3月末現在)

| | |
|----------|-------|
| ・道路整備率 | 33.2% |
| ・建物移転率 | 32.6% |
| ・使用収益開始率 | 28.0% |

新田駅西口土地区画整理事業の概要

名称: 草加都市計画事業

新田駅西口土地区画整理事業

場所: 草加市金明町地内


施行面積: 約10.6ha

施行期間: H22~R15(清算期間5年間を含む)

事業費: 約80.7億円

草加都市計画事業 新田駅西口土地区画整理事業

設計図(第1回変更)

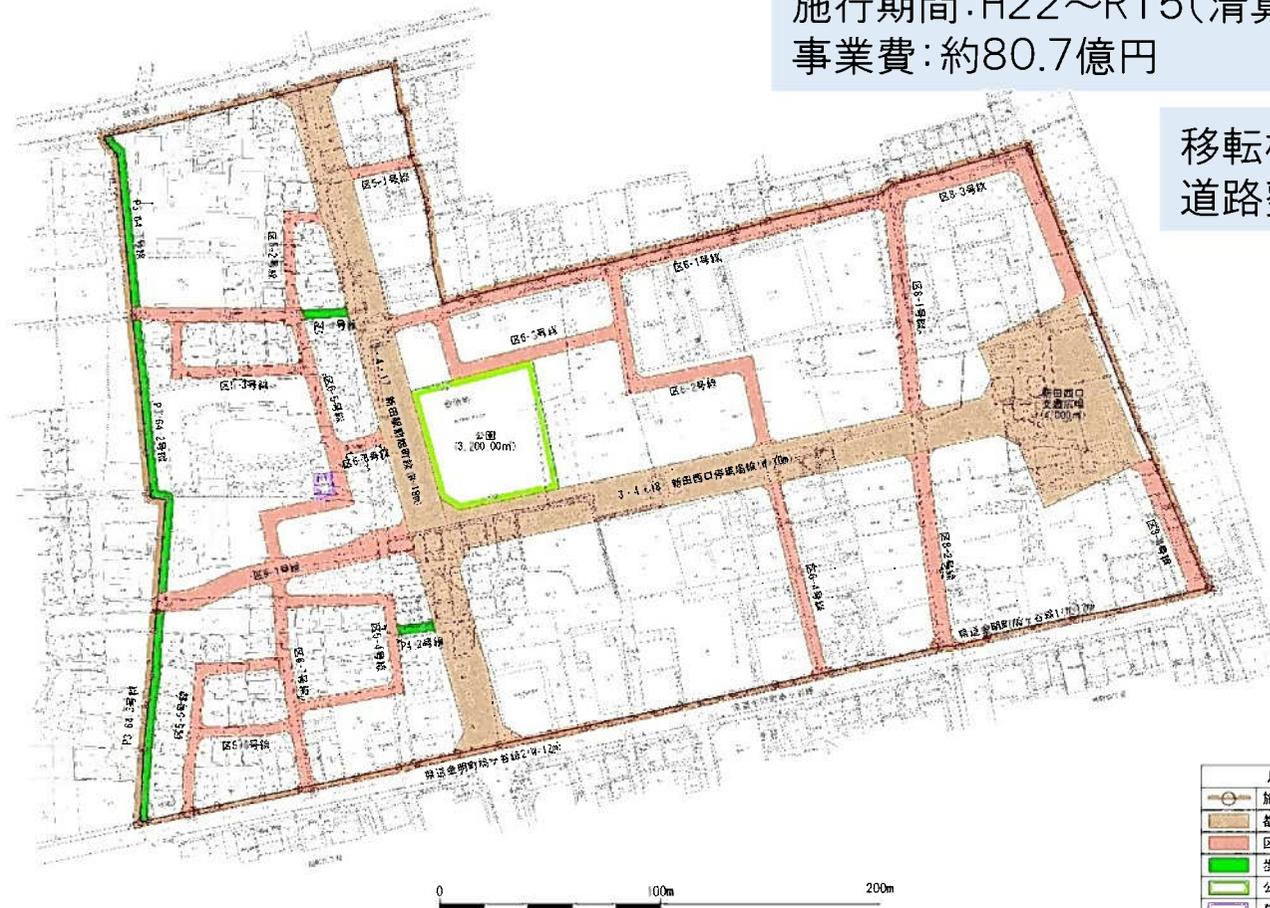

移転棟数: 114棟

道路整備延長: 2,860m

| 凡例 | |
|----|---------|
| | 施行地区界 |
| | 都市計画道路 |
| | 区画道路 |
| | 歩行者専用道路 |
| | 公園 |
| | 農地 |

新田駅西口土地区画整理事業の経緯

| | |
|-----------|---|
| 平成14年度 | 新田駅西口地区まちづくり協議会発足 |
| 平成17年度 | まちづくり協議会から「まちづくり構想案」の提案を受ける |
| 平成18～19年度 | まちづくり説明会、個別説明会、アンケート調査の実施 |
| 平成20年度 | 個別説明会の実施 |
| 平成21年度 | 都市計画決定 |
| 平成22年度 | 事業計画の許可・決定 |
| 平成23年度 | 審議会委員選挙と審議会設置 仮換地の供覧(個別説明) |
| 平成25年度 | 第1回仮換地指定(仮換地指定率約2.3%) 第2回仮換地指定(仮換地指定率約58.7%) |
| 平成26年度 | 第3回仮換地指定(仮換地指定率約62.5%) |
| 平成27年度 | 第4回仮換地指定(仮換地指定率約85.3%) |
| 平成28年度 | 第5回仮換地指定(仮換地指定率約94.5%) |
| 平成29年度 | 第6回仮換地指定(仮換地指定率約95.7%) |

※進捗率(令和3年3月末現在)

| | |
|----------|-------|
| ・道路整備率 | 34.7% |
| ・建物移転率 | 37.7% |
| ・使用収益開始率 | 26.9% |

社会資本総合整備計画


社会資本総合整備計画

平成27年3月10日

| 計画の名称 | 駒田駅周辺地区における都市基盤整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|------|-----------|-----|----------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------|------|-----------|------|------------|------------|-------|-------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|--|-----------|------|------------|------|------------|-----|------|-----|-------|------|----|-------|-----|-------|-----|----|-------|------------------|--------------|-----|--|--|--|--|--|-------|--|------|----|----|-----|----|-----|----|----|------------------|---------------|-----|--|--|--|--|--|-------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|------|------|------|------|-----|------|------|----------------|--------------|------|------------|--|--|--|--|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|-----|----|-----|----|----|---------|----------------|-----|--|--|--|--|--|-------|--|------|-------|----|-----|----|-----|----|----|---------|-----------------|-----|--|--|--|--|--|-------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|------|------|------|------|-----|----------|------|----------------|--------------|------|------------|--|--|--|--|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|----|----|---------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|-----|--|------|-----|----|-----|----|-----|----|----|-------------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|-----|--|------|-----|----|-----|----|-----|----|----|---------------|-----------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|------|------|------|------|-----|------|----------------|--------------|------|------------|--|--|--|--|------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----|------|------|------|------|-----|------|----------------|--------------|------|------------|--|--|--|--|------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 計画の期間 | 平成27年度～平成31年度(5年間) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 交付対象 草加市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>駒田駅周辺の道路、公園、下水道の整備等を行うことにより、良質な市街地形成と交通機能等の向上を図り、文化・生活の交流拠点として「美観性あふれる便利な北の玄関口のまち」をつくることを目的とする。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>計画の成果目標(定量的指標)</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共施設整備(下水道(汚水)整備率) 駒田駅周辺地区(新田駅西口土地地区)整備率 草加市民意識調査によるアンケート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>定量的指標の定義及び算定式</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>下水道(汚水)の整備率であり、以下の式により算出する。 下水道(汚水)の整備率(%) = 下水道(汚水)の整備計画面積 / 下水道(汚水)の整備計画面積 × 100%</p> <p>下水道(雨水)の整備率であり、以下の式により算出する。 下水道(雨水)の整備率(%) = 下水道(雨水)の整備計画面積 / 下水道(雨水)の整備計画面積 × 100%</p> <p>エリア別整備率(%)は以下の式により算出する。 エリア別整備率(%) = 整備計画面積 / 対象地敷積 × 100%</p> <p>草加市市民意識調査によるアンケート、問「あなたが最も多く利用する駅の乗降口は、どの駅の周辺は、商業、コミュニティ、交通の拠点として、安全で快適に利用できていると思いますか」のクロス集計により算出される。駒田駅西口が安全で快適だと思ふ人の率。</p> <p>草加市市民意識調査によるアンケート、問「あなたが最も多く利用する駅の乗降口は、どの駅の周辺は、商業、コミュニティ、交通の拠点として、安全で快適に利用できていると思いますか」のクロス集計により算出される。駒田駅東口が安全で快適だと思ふ人の率。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">定量的指標の状況及び目標値</th> <th colspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初年度値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.9%</td> <td>11.9%</td> <td>50.9%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7.4%</td> <td></td> <td>6.2%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1.3%</td> <td></td> <td>67.4%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.18%</td> <td></td> <td>50.0%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>19.0%</td> <td></td> <td>25.0%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 定量的指標の状況及び目標値 | | 備考 | | | 当初年度値 | 中間目標値 | 最終目標値 | | | 6.9% | 11.9% | 50.9% | | | 7.4% | | 6.2% | | | 1.3% | | 67.4% | | | 2.18% | | 50.0% | | | 19.0% | | 25.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の状況及び目標値 | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当初年度値 | 中間目標値 | 最終目標値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9% | 11.9% | 50.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4% | | 6.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3% | | 67.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18% | | 50.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.0% | | 25.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">全体事業費</th> <th colspan="2">合計(A+B+C)</th> <th colspan="2">A</th> <th colspan="2">B</th> <th colspan="2">C</th> <th colspan="2">効果検証と費用の割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">10,850百万円</td> <td colspan="2">10,850百万円</td> <td colspan="2">10,850百万円</td> <td colspan="2">0.00%</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.00%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | 全体事業費 | | 合計(A+B+C) | | A | | B | | C | | 効果検証と費用の割合 | | 10,850百万円 | | 10,850百万円 | | 10,850百万円 | | 0.00% | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | | 合計(A+B+C) | | A | | B | | C | | 効果検証と費用の割合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,850百万円 | | 10,850百万円 | | 10,850百万円 | | 0.00% | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>交付対象事業</p> <p>A1 道路事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">番号</th> <th rowspan="2">事業種別</th> <th rowspan="2">地域種別</th> <th rowspan="2">交付対象</th> <th rowspan="2">直接間接</th> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">道路種別</th> <th rowspan="2">省路工種</th> <th rowspan="2">要素となる事業名(事業箇所)</th> <th rowspan="2">事業内容(延長・面積等)</th> <th rowspan="2">市町村名</th> <th colspan="5">事業実施期間(年度)</th> <th rowspan="2">全体事業費(百万円)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1-1</td> <td>道路</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>区画</td> <td>改良</td> <td>駒田駅西口地区(新田駅西口地区)</td> <td>区画整理 A=0.9ha</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,518</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1-2</td> <td>道路</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>区画</td> <td>改良</td> <td>駒田駅西口地区(新田駅西口地区)</td> <td>区画整理 A=10.9ha</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,353</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,899</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>A2 市街地整備事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">番号</th> <th rowspan="2">事業種別</th> <th rowspan="2">地域種別</th> <th rowspan="2">交付対象</th> <th rowspan="2">直接間接</th> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">道路種別</th> <th rowspan="2">省路工種</th> <th rowspan="2">要素となる事業名(事業箇所)</th> <th rowspan="2">事業内容(延長・面積等)</th> <th rowspan="2">市町村名</th> <th colspan="5">事業実施期間(年度)</th> <th rowspan="2">全体事業費(百万円)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2-1</td> <td>市街地整備</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>区画</td> <td>改良</td> <td>駒田駅西口地区</td> <td>都市再生区画 A=6.3ha</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A2-2</td> <td>市街地整備</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>区画</td> <td>改良</td> <td>駒田駅西口地区</td> <td>都市再生区画 A=10.5ha</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,337</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,337</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>A3 下水道事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">番号</th> <th rowspan="2">事業種別</th> <th rowspan="2">地域種別</th> <th rowspan="2">交付対象</th> <th rowspan="2">直接間接</th> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業及び施設種別</th> <th rowspan="2">省路工種</th> <th rowspan="2">要素となる事業名(事業箇所)</th> <th rowspan="2">事業内容(延長・面積等)</th> <th rowspan="2">市町村名</th> <th colspan="5">事業実施期間(年度)</th> <th rowspan="2">全体事業費(百万円)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3-1</td> <td>下水道</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>汚水</td> <td>拡張</td> <td>草加市沖9処理分区分修事業</td> <td>汚水 A=34.5ha</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>938</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3-2</td> <td>下水道</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>雨水</td> <td>拡張</td> <td>外環北側水路高/排水区採録整備事業</td> <td>雨水 L=0.32km</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>183</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A3-3</td> <td>下水道</td> <td>一般</td> <td>草加市</td> <td>直接</td> <td>草加市</td> <td>雨水</td> <td>拡張</td> <td>金石町川第7排水区整備事業</td> <td>雨水 L=0.22km 積留=0.12ha</td> <td>草加市</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>481</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,614</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B 関連社会資本整備事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>事業種別</th> <th>地域種別</th> <th>交付対象</th> <th>直接間接</th> <th>事業名</th> <th>省路工種</th> <th>要素となる事業名(事業箇所)</th> <th>事業内容(延長・面積等)</th> <th>市町村名</th> <th colspan="5">事業実施期間(年度)</th> <th>全体事業費(百万円)</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>H27</td> <td>H28</td> <td>H29</td> <td>H30</td> <td>H31</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>C 効果検証事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>事業種別</th> <th>地域種別</th> <th>交付対象</th> <th>直接間接</th> <th>事業名</th> <th>省路工種</th> <th>要素となる事業名(事業箇所)</th> <th>事業内容(延長・面積等)</th> <th>市町村名</th> <th colspan="5">事業実施期間(年度)</th> <th>全体事業費(百万円)</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>H27</td> <td>H28</td> <td>H29</td> <td>H30</td> <td>H31</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>番号 一体的に実施することにより期待される効果</p> | | | | | | | | | | | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 道路種別 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | A1-1 | 道路 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区(新田駅西口地区) | 区画整理 A=0.9ha | 草加市 | | | | | | 2,518 | | A1-2 | 道路 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区(新田駅西口地区) | 区画整理 A=10.9ha | 草加市 | | | | | | 3,353 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,899 | | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 道路種別 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | A2-1 | 市街地整備 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区 | 都市再生区画 A=6.3ha | 草加市 | | | | | | 1,500 | | A2-2 | 市街地整備 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区 | 都市再生区画 A=10.5ha | 草加市 | | | | | | 1,337 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,337 | | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 事業及び施設種別 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | A3-1 | 下水道 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 汚水 | 拡張 | 草加市沖9処理分区分修事業 | 汚水 A=34.5ha | 草加市 | | | | | | 938 | | A3-2 | 下水道 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 雨水 | 拡張 | 外環北側水路高/排水区採録整備事業 | 雨水 L=0.32km | 草加市 | | | | | | 183 | | A3-3 | 下水道 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 雨水 | 拡張 | 金石町川第7排水区整備事業 | 雨水 L=0.22km 積留=0.12ha | 草加市 | | | | | | 481 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,614 | | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 道路種別 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | | | | | | | | | | | | 事業実施期間(年度) | | | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1-1 | 道路 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区(新田駅西口地区) | 区画整理 A=0.9ha | 草加市 | | | | | | 2,518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1-2 | 道路 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区(新田駅西口地区) | 区画整理 A=10.9ha | 草加市 | | | | | | 3,353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 道路種別 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2-1 | 市街地整備 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区 | 都市再生区画 A=6.3ha | 草加市 | | | | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2-2 | 市街地整備 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 区画 | 改良 | 駒田駅西口地区 | 都市再生区画 A=10.5ha | 草加市 | | | | | | 1,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 事業及び施設種別 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3-1 | 下水道 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 汚水 | 拡張 | 草加市沖9処理分区分修事業 | 汚水 A=34.5ha | 草加市 | | | | | | 938 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3-2 | 下水道 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 雨水 | 拡張 | 外環北側水路高/排水区採録整備事業 | 雨水 L=0.32km | 草加市 | | | | | | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3-3 | 下水道 | 一般 | 草加市 | 直接 | 草加市 | 雨水 | 拡張 | 金石町川第7排水区整備事業 | 雨水 L=0.22km 積留=0.12ha | 草加市 | | | | | | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業名 | 省路工種 | 要素となる事業名(事業箇所) | 事業内容(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費(百万円) | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

社会資本総合整備計画

(参考図面) 社会資本総合整備計画

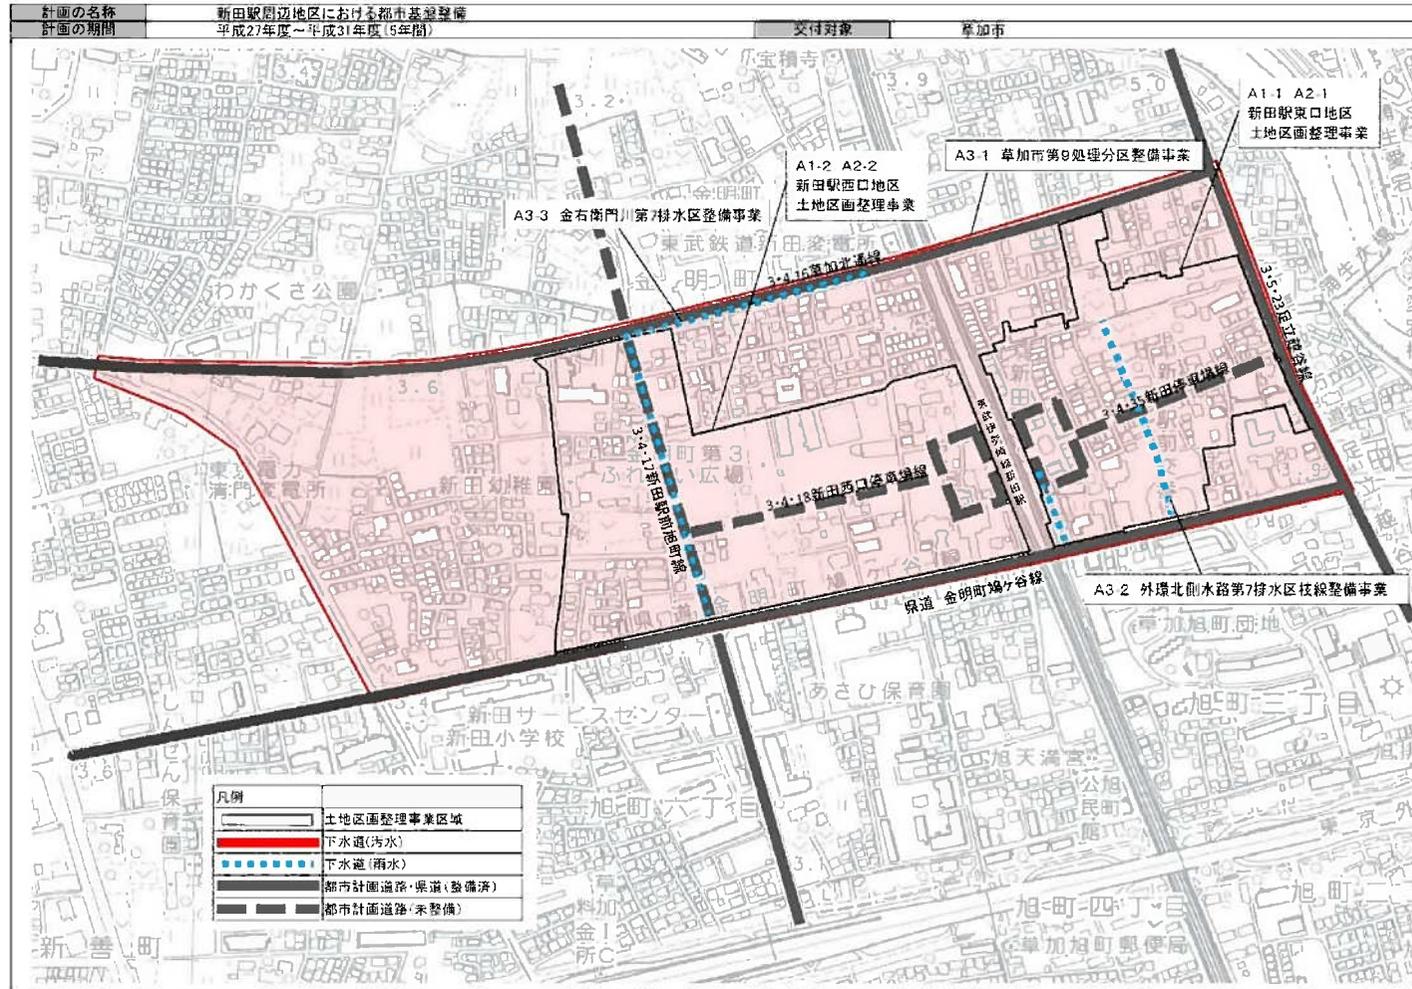

事前評価について

■ 評価項目

社会資本整備総合交付金を活用し事業を行う場合、社会資本整備総合交付金交付要綱などに基づき事前評価や事後評価等を実施することとしており、事前評価については国が例示しているチェックシートに基づき、以下の項目について、実施しました。

I 目標の妥当性

- ①上位計画等との整合性
- ②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)

II 計画の効果・効率性

- ①目標と事業内容の整合性等
 - 1)整備計画の目標と定量的指標の整合性
 - 2)目標と事業内容の整合性
 - 3)定量的指標の明瞭性
- ②事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性

III 計画の実現

- ①地元の熱意(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)
- ②円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)

事前評価 評価項目(区画整理事業)

I 目標の妥当性

①上位計画等との整合性

■都市計画マスタープラン(H11.6)

○地域核(新田駅周辺)の形成

新田駅周辺を生活圏の中心として位置づけ、アクセスの向上を図るとともに、商業・行政・コミュニティなどの地域サービス機能を充実し、特性を活かした個性的な地区中心の整備を推進する。

②地域の課題への対応


■草加都市計画事業新田駅東口土地区画整理事業 事業計画書 抜粋

当地区は駅前広場などの都市計画道路が未整備の地区となっている。また、道路の幅員は狭小で、行き止まり道路が多く、緊急車両の進入路や災害時の避難通路の確保等、安全性の面からも課題となっている。

そのため、区画整理事業により、一体的な整備・改善することを目的とする。

■草加都市計画事業新田駅西口土地区画整理事業 事業計画書 抜粋

市内4駅の中で、駅周辺の都市基盤整備が最も遅れている地区であり、その整備が以前より要望されている地区である。道路・公園などの公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図るとともに、防災に強い駅周辺地区にふさわしい環境を整備することを事業の目的とする。

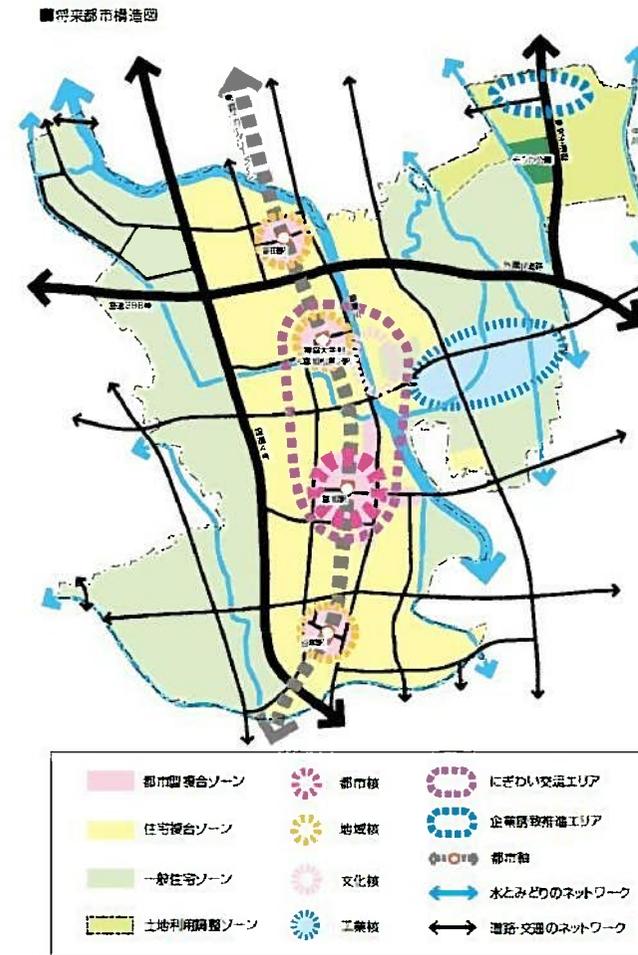

事前評価 評価項目(区画整理事業)

Ⅱ 計画の効果・効率性

①目標と事業内容の整合性等

1)整備計画の目標と定量的指標の整合性

《社会資本総合整備計画の目標 抜粋》

・新田駅周辺の道路、公園、下水道の整備等を行うことによって、良好な市街地形成と交通機能等の向上を図る。

《計画の成果目標(定量的指標)》

- ・新田駅東口土地区画整理事業区域内及び新田駅西口土地区画整理事業区域内の宅地整備率 1.3%→67.2%
- ・草加市市民意識調査アンケート 新田駅西口が安全で快適だと思ふ人の率 21.8%→30.0%
- ・草加市市民意識調査アンケート 新田駅東口が安全で快適だと思ふ人の率 19.0%→25.0%

2)目標と事業内容の整合性

《社会資本総合整備計画の目標 抜粋》

・新田駅周辺の道路、公園、下水道の整備等を行うことによって良好な市街地形成と交通機能等の向上を図る。

《事業内容》

・土地区画整理事業による一体的な整備により、交通広場、都市計画道路や区画街路、街区公園等の公共施設を整備し、市街地の整備改善を図る。

事前評価 評価項目(区画整理事業)

Ⅱ 計画の効果・効率性

3)定量的指標の明瞭性

- ・新田駅東口と新田駅西口の施行面積の合計に占める、使用収益開始面積で算出。
- ・草加市市民意識調査の問「あなたが最も多く利用する駅の乗降口は」と問「駅周辺は商業、コミュニティ、交通の拠点として、安全で快適に利用できていると思うか」のクロス集計により算出。

②事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性

- ・下水道(汚水・雨水)の整備及び宅地整備
当該地区の下水道整備は遅れているため、区画整理事業による、宅地整備や街路築造に合わせて、下水道を整備することは効果的であり、事業の見込みについては妥当性があると考えられる。

事前評価 評価項目(区画整理事業)

Ⅲ 計画の実現

①地元の熱意（まちづくりに向けた機運など）

・地元住民によるまちづくり協議会の発足、まちづくり住民提案書(東口)やまちづくり構想案（西口）の提出を契機として、地域との協働によるまちづくりを進めてきている。

②円滑な事業執行の環境（事業熟度など）

・土地区画整理事業については、事業計画のほか、関連するインフラ整備(下水、水道等)を含めた、工事移転計画を作成し、これに基づきながら事業を進めている。

事前評価 評価項目(下水道事業)

I 目標の妥当性

①上位計画等との整合性

■中川流域関連草加公共下水道事業計画

河川等の水質保全、生活環境の改善、浸水の防除、健全な水循環の確保を目的として安全で安心な生活基盤を確保する

②地域の課題への対応

■第9処理分区(汚水)、外環北側水路第7排水区及び金右衛門川第7排水区(雨水)

当地区は公共下水道未整備地区であるため区画整理事業の進捗に合わせて上位計画に沿って整備する必要がある

事前評価 評価項目(下水道事業)

Ⅱ 計画の効果・効率性

①目標と事業内容の整合性等

1)整備計画の目標と定量的指標の整合性

《社会資本総合整備計画の目標 抜粋》

・新田駅周辺の道路、公園、下水道の整備等を行うことによって、良好な市街地形成と交通機能等の向上を図る。

《計画の成果目標(定量的指標)》

- ・汚水整備率 7.0%→50.9%
- ・雨水整備率 1.4%→6.2%

2)目標と事業内容の整合性

《社会資本総合整備計画の目標 抜粋》

・新田駅周辺の道路、公園、下水道の整備等を行うことによって良好な市街地形成と交通機能等の向上を図る。

《事業内容》

・区画整理事業の進捗とともに公共下水道の整備を実施し、良好な生活環境の創出を図る。

事前評価 評価項目(下水道事業)

Ⅱ 計画の効果・効率性

3)定量的指標の明瞭性

・上位計画である中川流域関連草加公共下水道事業計画のうち各処理分区及び各排水区の区域面積を対象とし、整備実施面積で算出。

②事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性

・下水道(汚水・雨水)の整備及び宅地整備

→当該地区の下水道整備は遅れているため、区画整理事業による、宅地整備や街路築造に合わせて、下水道を整備することは効果的であり、事業の見込みについては妥当性があると考えられる。

事前評価 評価項目(下水道事業)

Ⅲ 計画の実現

①地元の熱意(まちづくりに向けた機運など)

- ・公共下水道の整備に関してもかねてから地元住民から要望を受け付けていたことから、計画の実現に際して地元の熱意やまちづくりにむけた機運はあると考えられる。

②円滑な事業執行の環境(事業熟度など)

- ・区画整理事業と下水道事業が一体となって、整備を進めていくことは効果的であり、双方の整備計画の情報提供及び共有を行っている等、円滑な事業執行の環境は整っていると考えられる。

事後評価について

■ 事後評価の内容

事後評価については、国の社会資本整備総合交付金交付要綱及び草加市社会資本整備総合交付金評価実施要綱に基づき、以下の内容について事後の評価を行います。

1. 要素事業の進捗状況

→各事業の進捗状況の確認を行います。

2. 事業効果の発現状況

→各事業で行ってきたことが、どのような効果を与えているか検証を行います。

3. 評価指標の最終目標値の実現状況

→事業を行う前に設定した目標値がどの程度達成されているか検証を行います。

4. 今後の方針

→1～3の結果を踏まえ、今後の方針を決定します。

事後評価 結果①(区画整理事業)

1. 要素事業の進捗状況

【道路事業】(単位:円) ○事業内容 建物移転、街路築造など

・新田駅東口

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| H27 | 7,771,680 | 1,340,000 | 737,000 |
| H28 | 32,728,742 | 24,200,000 | 13,310,000 |
| H29 | — | — | — |
| H30 | 274,543,327 | 235,148,000 | 117,574,000 |
| R1 | 378,542,197 | 351,400,000 | 175,700,000 |
| 合計 | 693,585,946 | 612,088,000 | 307,321,000 |

・新田駅西口

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| H27 | 62,026,399 | 50,400,000 | 27,720,000 |
| H28 | 10,275,314 | 9,000,000 | 4,950,000 |
| H29 | 152,589,845 | 145,000,000 | 79,750,000 |
| H30 | 36,018,742 | 16,170,000 | 8,085,000 |
| R1 | 104,306,900 | 88,690,000 | 44,435,000 |
| 合計 | 365,217,200 | 309,260,000 | 164,940,000 |

事後評価 結果①（区画整理事業）

1. 要素事業の進捗状況

【市街地整備事業】(単位:円) ○事業内容 建物移転、街路築造など

・新田駅東口

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|---------------|---------------|-------------|
| H27 | 41,439,600 | 29,200,000 | 14,600,000 |
| H28 | — | — | — |
| H29 | 328,051,747 | 324,984,000 | 162,492,000 |
| H30 | 541,552,511 | 523,150,000 | 261,575,000 |
| R1 | 239,822,980 | 209,582,000 | 104,791,000 |
| 合計 | 1,150,866,838 | 1,086,916,000 | 543,458,000 |

・新田駅西口

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| H27 | 59,497,757 | 48,260,000 | 24,130,000 |
| H28 | 87,532,079 | 79,506,000 | 39,753,000 |
| H29 | 541,111,290 | 530,000,000 | 265,000,000 |
| H30 | 37,473,912 | 35,268,000 | 17,634,000 |
| R1 | 217,283,317 | 205,450,000 | 102,725,000 |
| 合計 | 942,898,355 | 898,484,000 | 449,242,000 |

事後評価 結果①（区画整理事業）

1. 要素事業の進捗状況

5カ年計画の計画事業費9,236,000,000円に対して、実施した総事業費3,152,568,339円となり、計画内の事業費となったため、適切であった。

| 要素事業 | 事業費 (5カ年合計) | 補助基本額 (5カ年合計) | 交付決定額 (5カ年合計) |
|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 道路事業(新田駅東口) | 693,585,946 | 612,088,000 | 307,321,000 |
| 道路事業(新田駅西口) | 365,217,200 | 309,260,000 | 164,940,000 |
| 市街地整備事業(新田駅東口) | 1,150,866,838 | 1,086,916,000 | 543,458,000 |
| 市街地整備事業(新田駅西口) | 942,898,355 | 898,484,000 | 449,242,000 |
| 合計 | 3,152,568,339 | 2,906,748,000 | 1,464,961,000 |

事後評価 結果②（区画整理事業）

2. 事業効果の発現状況

建物移転について、新田駅東口は平成27年度当初の移転棟数0棟から令和元年度末時点で37棟（進捗率19.5%）、新田駅西口は平成27年度当初の移転棟数9棟から令和元年度末時点で40棟（進捗率35.1%）となった。

道路整備についても、新田駅東口は平成27年度当初の整備延長0mから令和元年度末時点で383.8m（進捗率17.8%）、新田駅西口は平成27年度当初の整備延長232mから令和元年度末時点で746.7m（進捗率26.1%）となり、着実な事業進捗が図られていることから、計画の目標である、新田駅周辺の良好な市街地形成と交通機能等の向上につながっていると考えられる。

| 新田駅東口 | 全体数 | 平成27年度 | 進捗率 | → | 令和元年度 | 進捗率 |
|-------|---------|--------|-----|---|--------|-------|
| 建物移転 | 190棟 | 0棟 | 0% | → | 37棟 | 19.5% |
| 道路整備 | 2, 158m | 0m | 0% | → | 383.8m | 17.8% |

| 新田駅西口 | 全体数 | 平成27年度 | 進捗率 | → | 令和元年度 | 進捗率 |
|-------|---------|--------|------|---|--------|-------|
| 建物移転 | 114棟 | 9棟 | 7.9% | → | 40棟 | 35.1% |
| 道路整備 | 2, 860m | 232m | 8.1% | → | 746.7m | 26.1% |

事後評価 結果③（区画整理事業）

3. 評価指標の最終目標値の実現状況

【定量的指標の最終目標の実現状況】

- ・定量的指標の最終目標値の実現状況について、算定結果は以下のとおりとなります。
- ・算定方法については、《定量的指数の定義及び算定式》のとおりです。

| 指標番号 | 指標名称 | 単位 | 全体数 | 当初 | 目標値 | 実施値 |
|------|-----------------|----|-------|------|------|------|
| 指標① | 区画整理事業 宅地整備率 | ha | 11.43 | 1.3 | 7.69 | 2.54 |
| | | % | 100 | 11.4 | 67.2 | 22.2 |
| 指標② | 市民意識調査 新田駅西口 | % | 100 | 21.8 | 30.0 | 18.6 |
| 指標③ | 市民意識調査 新田駅東口 | % | 100 | 19.0 | 25.0 | 17.7 |


事後評価 結果③（区画整理事業）

3. 評価指標の最終目標値の実現状況 【新田駅東口使用収益開始箇所図】（令和元年度末時点）



事後評価 結果③（区画整理事業）

3. 評価指標の最終目標値の実現状況 【新田駅西口使用収益開始箇所図】(令和元年度末時点)

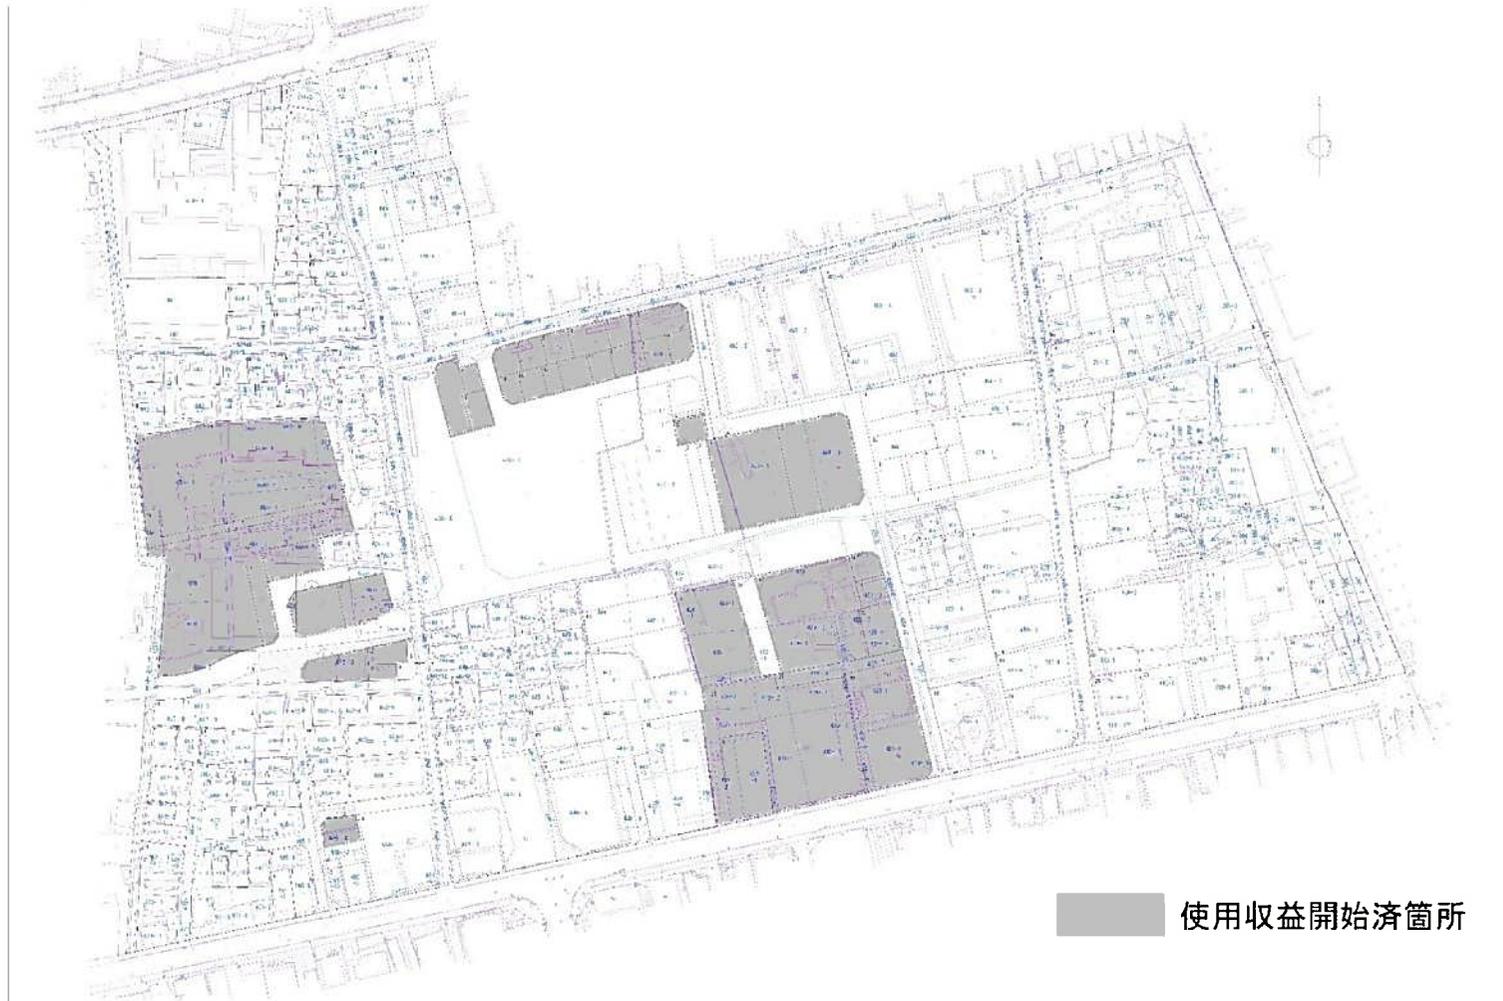

事後評価 結果④（区画整理事業）

【事前評価の際の定量的指標との差について】

①区画整理事業 宅地整備率

新田駅西口において、建物移転計画の見直しを行い、事業計画も8年の延長をする等、当初の計画から大幅な変更があったため。当初計画数値を下回った。

新田駅東口において、事業開始当初は、仮換地指定等を行い、宅地造成が進まなかったことから、当初計画数値を下回った。

②市民意識調査 新田駅西口

区画整理事業に伴い、駅周辺の道路整備による迂回や通行止め等が不便さや安全面の不安を感じることに伴い、数値が下回ったと考えられる。

③市民意識調査 新田駅東口

区画整理事業に伴い、駅前店舗の移転等による不便さ及び駅周辺の空き地が増えたことが、夜間の防犯面の不安等に伴い、数値が下回ったと考えられる。

事後評価 結果①(下水道事業)

1. 要素事業の進捗状況

【下水道事業】(単位:円) ○事業内容 污水管布設工事

・草加市第9処理分区整備事業

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|-------------|------------|------------|
| H27 | 41,148,000 | 36,000,000 | 18,000,000 |
| H28 | 43,383,600 | 32,000,000 | 16,000,000 |
| H29 | 28,236,600 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| H30 | 74,291,040 | 8,000,000 | 4,000,000 |
| R1 | — | — | — |
| 合計 | 187,059,240 | 96,000,000 | 48,000,000 |

事後評価 結果①（下水道事業）

1. 要素事業の進捗状況

【下水道事業】(単位:円) ○事業内容 雨水管敷設工事

・外環北側水路第7排水区枝線整備事業

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|------------|------------|-----------|
| H27 | — | — | — |
| H28 | — | — | — |
| H29 | 52,390,800 | 15,600,000 | 7,800,000 |
| H30 | — | — | — |
| R1 | — | — | — |
| 合計 | 52,390,800 | 15,600,000 | 7,800,000 |

・金右衛門川第7排水区整備事業

| | 事業費 | 補助基本額 | 交付決定額 |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| H27 | — | — | — |
| H28 | 19,440,000 | 16,000,000 | 8,000,000 |
| H29 | 128,520,000 | 114,000,000 | 57,000,000 |
| H30 | 204,822,000 | 121,600,000 | 60,800,000 |
| R1 | 24,776,400 | 3,600,000 | 1,800,000 |
| 合計 | 377,558,400 | 255,200,000 | 127,600,000 |

事後評価 結果①（下水道事業）

1. 要素事業の進捗状況

5カ年計画の計画事業費1,614,000,000円に対して、実施した総事業費617,008,440円となり、計画内の事業費となった。

| 要素事業 | 事業費 (5カ年合計) | 補助基本額 (5カ年合計) | 交付決定額 (5カ年合計) |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 第9処理分区整備事業 | 187,059,240 | 96,000,000 | 48,000,000 |
| 外環北側水路第7排水区枝線整備事業 | 52,390,800 | 15,600,000 | 7,800,000 |
| 金右衛門川第7排水区整備事業 | 377,558,400 | 255,200,000 | 127,600,000 |
| 合計 | 617,008,440 | 366,800,000 | 183,400,000 |

事後評価 結果②（下水道事業）

2. 事業効果の発現状況

汚水整備については、平成27年度当初の整備済み面積2.26haから令和元年度末時点で4.39haとなり、下水道接続による水質改善が図られた。

雨水整備についても、平成27年度当初の整備済み面積0.49haから令和元年度時点で2.01haとなり、浸水軽減が図られた。

事後評価 結果③（下水道事業）

3. 評価指標の最終目標値の実現状況

【定量的指標の最終目標の実現状況】

- ・定量的指標の最終目標値の実現状況について、算定結果は以下のとおりとなります。
- ・算定方法については、《定量的指数の定義及び算定式》のとおりです。

| 指標番号 | 指標名称 | 単位 | 全体数 | 当初 | 目標値 | 実施値 |
|------|------------|----|-------|------|-------|------|
| 指標① | 下水道整備率(汚水) | ha | 34.51 | 2.26 | 17.58 | 4.39 |
| | | % | 100 | 7.0 | 50.9 | 12.7 |
| 指標② | 下水道整備率(雨水) | ha | 34.51 | 0.49 | 2.17 | 2.01 |
| | | % | 100 | 1.4 | 6.2 | 5.8 |

事後評価 結果④（下水道事業）

【事前評価の際の定量的指標との差について】

- ・区画整理事業の進捗に合わせた公共下水道事業の整備となったため、当初計画数値を下回った。

今後の方針(案)

- ・今回の平成27年度から令和元年度までの整備計画を引き続き、令和2年度以降も継続していく。
- ・「発展性あふれる便利な北の玄関口のまち」をつくるため、新田駅周辺の道路、公園、下水道の整備等を行い、良好な市街地形成を図る。
