


社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

平成28年3月 日

計画の名称	安全で安心なまちづくりと綾瀬川沿いの防災拠点の形成（防災・安全）																																		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）			交付対象	草加市																														
計画の目標	第三次草加市総合振興計画において、快適な生活環境を形成するため、緑とオープンスペースの保全・整備及び緑化を推進すること、さらに草加市都市計画マスタープランにおいては、快適でうるおいのある住環境づくりの推進が位置づけられていることから、公園などの計画的な整備や都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業などにより、市民生活の利便性・快適性の確保に努めます。 特に、綾瀬川左岸地区は、第三次草加市総合振興計画で心地良い風景をつくる「草加松原・綾瀬川左岸」プロジェクト、さらに都市計画マスタープランでは「文化核」として、市民文化の拠点機能の拡充を図るとともに、シンボルゾーンにふさわしい都市景観の誘導が位置づけられています。綾瀬川や松並木などの貴重な景観資源を活かし、中心市街地における貴重な都市空間や水辺環境、回遊路線の整備、さらには防災機能の向上を図るため一次避難地、防災活動拠点を整備し、魅力ある地域拠点づくりを進めます。																																		
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>綾瀬川左岸防災公園（一次避難地）の避難者の収容人員を12,500人から16,000人へ増加</li> <li>都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画に基づき、施設更新、バリアフリー化等を実施する都市公園の実施率を0%から4%へ増加</li> </ul>																																		
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="6">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th colspan="3">最終目標値 (H25末)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>綾瀬川左岸防災公園（一次避難地）の整備により、公園面積が約3.2ha（一次整備）から約4.1ha（将来計画）へ増加することから、避難者の収容人員を算定する。</td> <td>12,500人</td> <td>-</td> <td colspan="3">16,000人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画に基づき、施設更新、バリアフリー化等を実施する都市公園の実施率を算定する。</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td colspan="3">4%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								定量的指標の現況値及び目標値						備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)				綾瀬川左岸防災公園（一次避難地）の整備により、公園面積が約3.2ha（一次整備）から約4.1ha（将来計画）へ増加することから、避難者の収容人員を算定する。	12,500人	-	16,000人				都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画に基づき、施設更新、バリアフリー化等を実施する都市公園の実施率を算定する。	0%	-	4%			
	定量的指標の現況値及び目標値						備考																												
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)																																
綾瀬川左岸防災公園（一次避難地）の整備により、公園面積が約3.2ha（一次整備）から約4.1ha（将来計画）へ増加することから、避難者の収容人員を算定する。	12,500人	-	16,000人																																
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画に基づき、施設更新、バリアフリー化等を実施する都市公園の実施率を算定する。	0%	-	4%																																
全体事業費	合計 (A+B+C)	614百万円	A	540百万円	B	0百万円	C	74百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	12.1%																									
<b>事後評価（中間評価）</b>																																			
事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																																			
事後評価（中間評価）の実施体制					事後評価（中間評価）の実施時期																														
【実施体制】草加市社会資本整備総合交付金評価委員会による事後評価を実施 【評価値の確認方法】計画策定時の定量的指標の定義及び算定式に基づき算定					事後評価：平成27年度 公表の方法 草加市のホームページに掲載																														
<b>1. 交付対象事業の進捗状況</b>																																			
交付対象事業																																			
A1 基幹事業																																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																				
1-A-1	公園	一般	草加市	直接	草加市	都市公園事業（綾瀬川左岸防災公園）	園路、広場、管理施設等 0.9ha	草加市	H22	H23	H24	H25	H26	496																					
1-A-2	公園	一般	草加市	直接	草加市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	施設更新、バリアフリー化等 11公園	草加市						44																					
									小計				540																						
B 関連社会資本整備事業																																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																				
									合計				0																						
番号 一体的に実施することにより期待される効果											0																								
											合計	0	備考																						
C 効果促進事業																																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																				
1-C-1	公園	一般	草加市	直接	草加市	都市公園事業（（仮称）新田西部第2公園）	公園整備 0.2ha	草加市	H22	H23	H24	H25	H26	20																					
1-C-2	公園	一般	草加市	直接	草加市	都市公園事業（（仮称）新田西部第11公園）	公園整備 0.3ha	草加市						24																					
1-C-3	公園	一般	草加市	直接	草加市	都市公園事業（（仮称）新田西部第10公園）	公園整備 0.2ha	草加市						30																					
									合計				74																						
番号 一体的に実施することにより期待される効果											備考																								
1-C-1	公園事業（1-A-1）と共に、都市公園を整備することで、公園の計画的な整備を推進し、市民生活の利便性、快適性の向上を図るとともに、地域防災活動の場、一時的な避難の場、及び延焼の緩和などの役割を担う防災空間を確保することにより、防災機能の向上を図る。																																		
1-C-2	公園事業（1-A-1）と共に、都市公園を整備することで、公園の計画的な整備を推進し、市民生活の利便性、快適性の向上を図るとともに、地域防災活動の場、一時的な避難の場、及び延焼の緩和などの役割を担う防災空間を確保することにより、防災機能の向上を図る。																																		
1-C-3	公園事業（1-A-1）と共に、都市公園を整備することで、公園の計画的な整備を推進し、市民生活の利便性、快適性の向上を図るとともに、地域防災活動の場、一時的な避難の場、及び延焼の緩和などの役割を担う防災空間を確保することにより、防災機能の向上を図る。																																		
交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。																																			
<b>2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況</b>																																			
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>綾瀬川左岸防災公園（一次避難地）の整備により、避難者の収容人員が増加し、地域防災機能が向上した。</li> <li>公園施設の更新やバリアフリー化等の実施により、安全で安心に利用できる公園が増加し、公園利用環境が向上した。</li> </ul>																																			
定量的指標の達成状況		指標（避難者の収容人数）	最終目標値	16,000人	目標値と実績値に差が出た要因																														
			最終実績値	16,000人																															
定量的指標の達成状況		指標（都市公園のバリアフリー化等実施率）	最終目標値	4%	目標値と実績値に差が出た要因																														
			最終実績値	4%																															
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>綾瀬川左岸防災公園は、毎年開催される草加ふささら祭りをはじめ、年間を通して各種イベントが開催されており、賑わい創出拠点を担っております。また、平成26年度には、九都県市合同防災訓練の会場にも使用されるなど、この地域のみならず草加市における重要な防災拠点として利活用されております。</li> </ul>																																			
<b>3. 特記事項（今後の方針等）</b>																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>綾瀬川左岸防災公園は、日常は市民の憩いの場として、また災害時には防災拠点の場として利用できるよう適切な維持管理を継続してまいります。</li> <li>公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き公園利用環境の向上に努めてまいります。</li> </ul>																																			

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	安全で安心なまちづくりと綾瀬川沿いの防災拠点の形成(防災・安全)		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	草加市

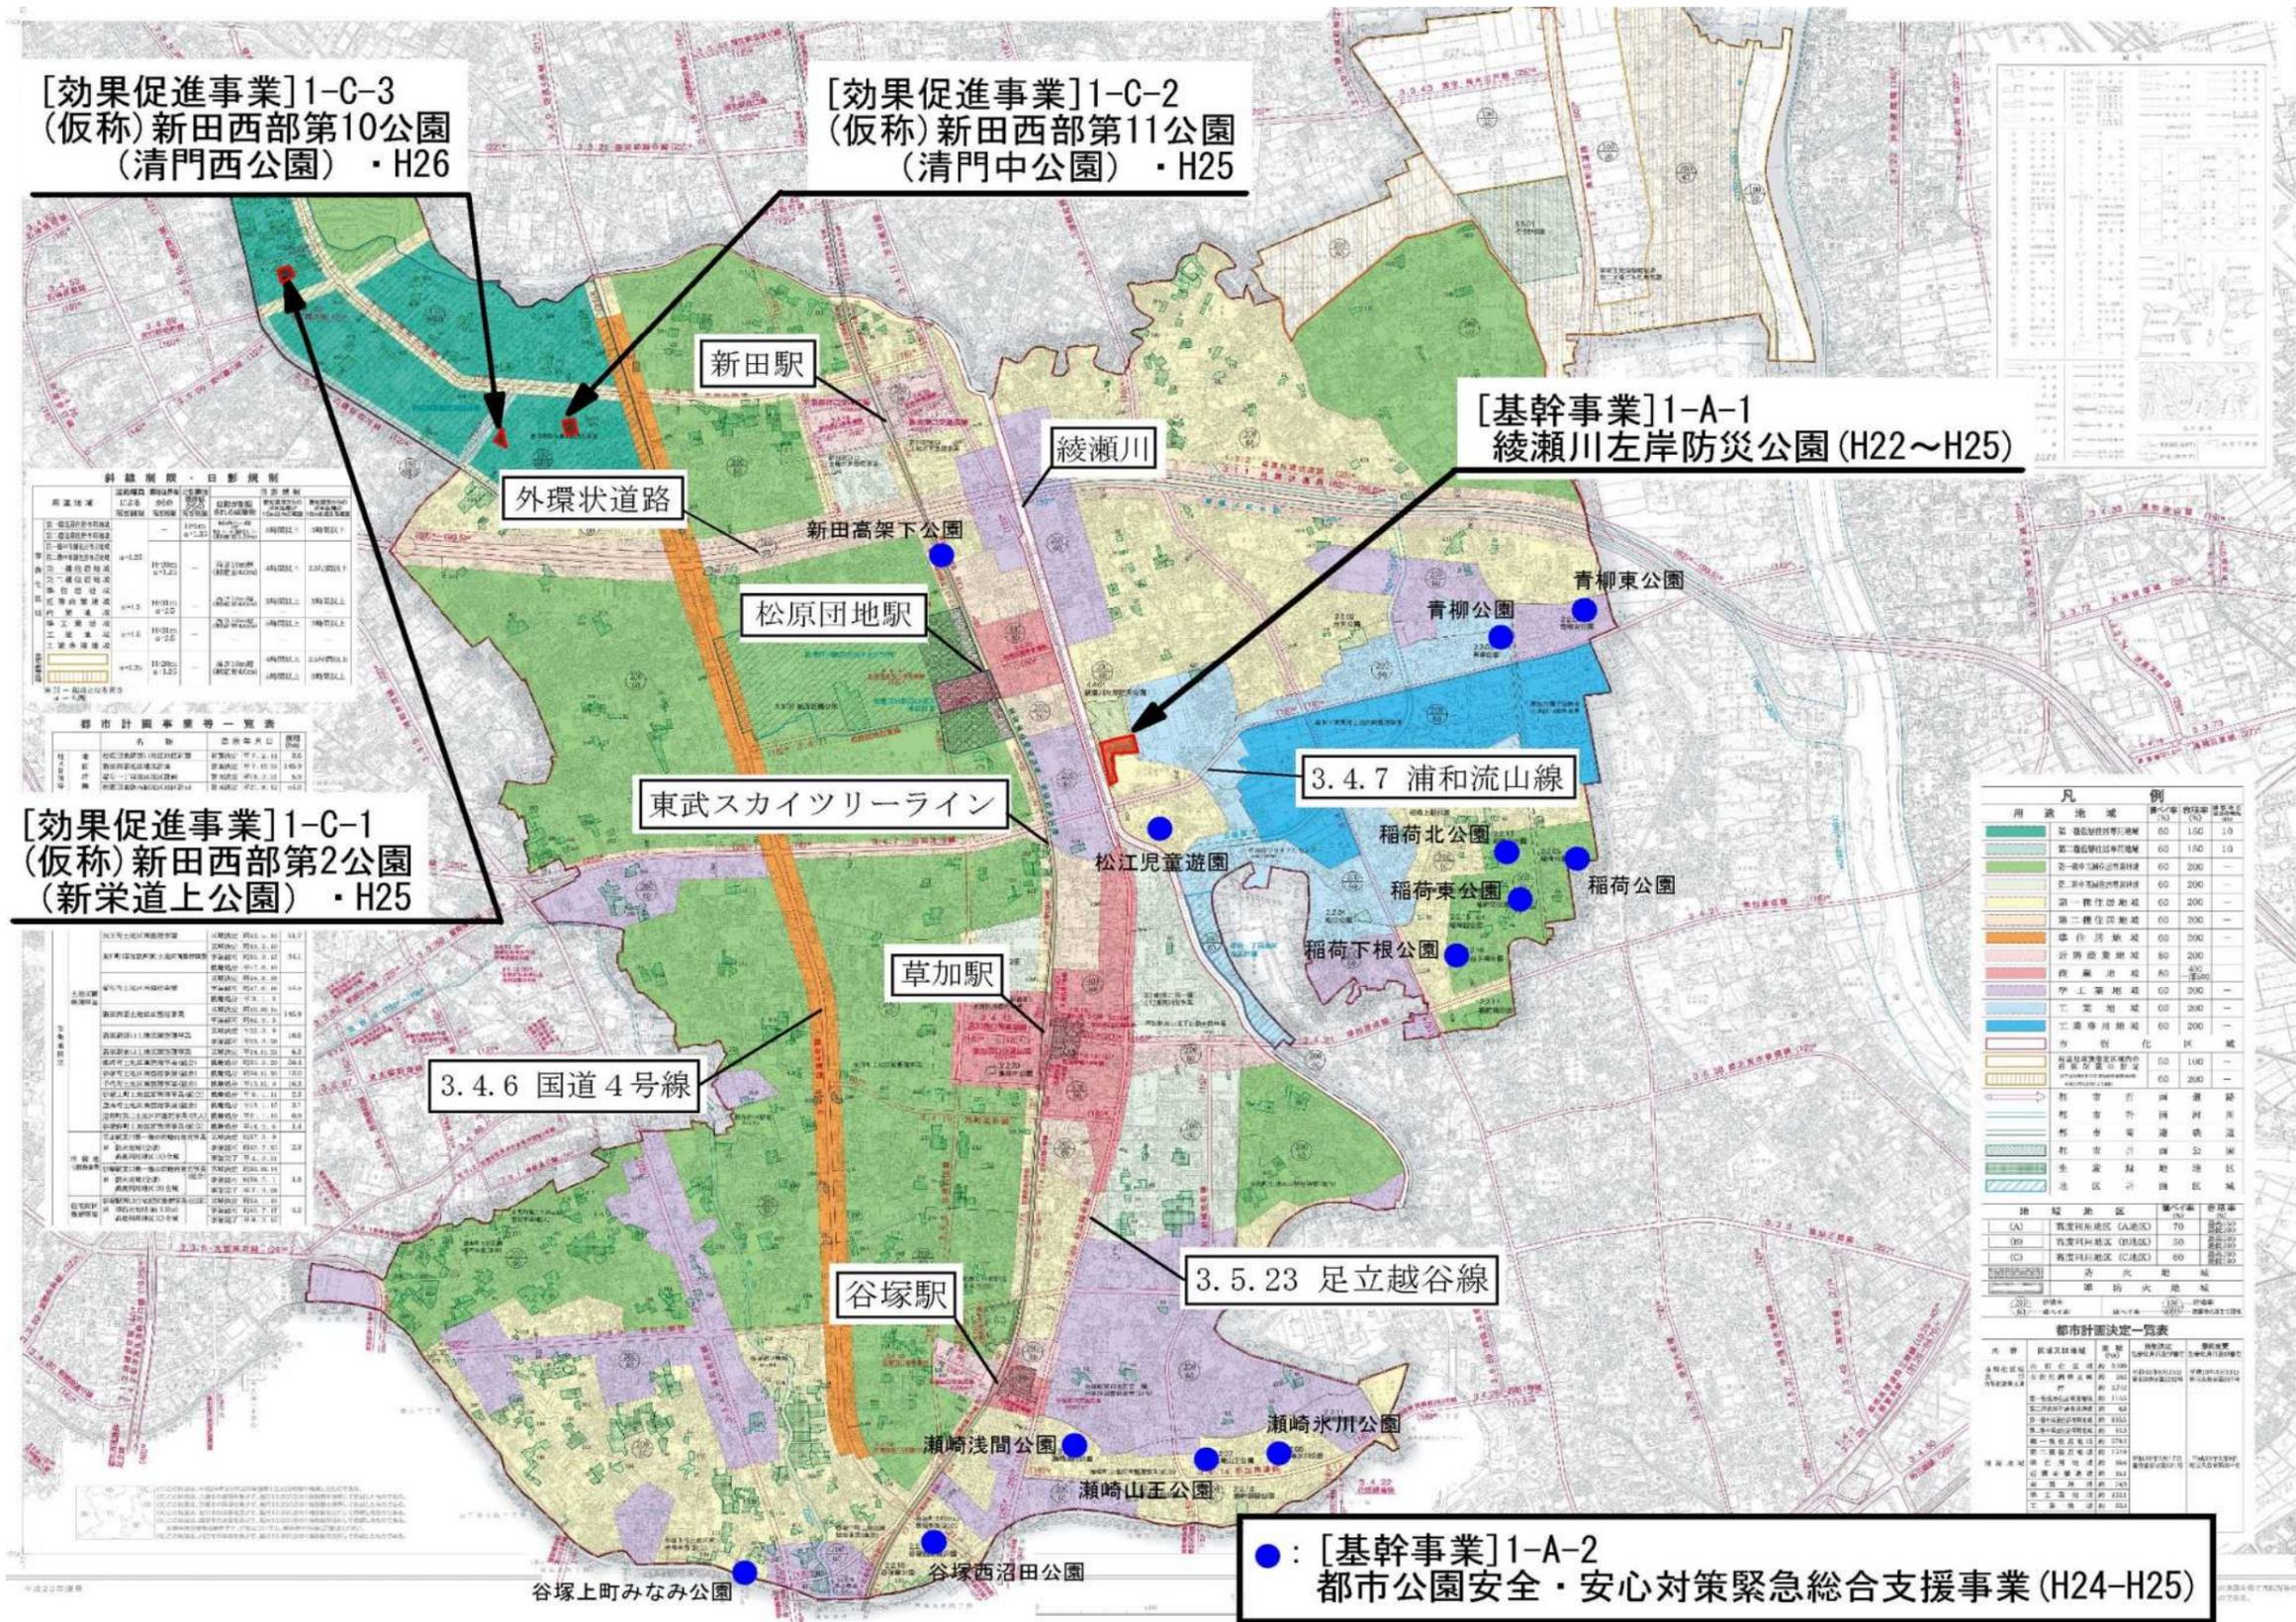

斜線制限・日影規制

用途地域	斜線制限	日影規制
第一種住居地域	なし	なし
第二種住居地域	なし	なし
第三種住居地域	なし	なし
第四種住居地域	なし	なし
第一種商業地域	なし	なし
第二種商業地域	なし	なし
第三種商業地域	なし	なし
第一種工業地域	なし	なし
第二種工業地域	なし	なし
第三種工業地域	なし	なし

都市計画事業等一覧表

事業名	事業種別	事業内容	事業期間	事業費(億円)
新田西部第10公園	公園	公園整備	2024年度	10.0
新田西部第11公園	公園	公園整備	2025年度	10.0
新田西部第2公園	公園	公園整備	2025年度	10.0

凡例

用途地域	色	備考
第一種住居地域	緑	60/100/1.0
第二種住居地域	黄緑	60/100/1.0
第三種住居地域	黄	60/200/-
第四種住居地域	黄	60/200/-
第一種商業地域	黄	60/200/-
第二種商業地域	黄	60/200/-
第三種商業地域	黄	60/200/-
第一種工業地域	黄	60/200/-
第二種工業地域	黄	60/200/-
第三種工業地域	黄	60/200/-

都市計画決定一覧表

用途地域	色	備考
第一種住居地域	緑	60/100/1.0
第二種住居地域	黄緑	60/100/1.0
第三種住居地域	黄	60/200/-
第四種住居地域	黄	60/200/-
第一種商業地域	黄	60/200/-
第二種商業地域	黄	60/200/-
第三種商業地域	黄	60/200/-
第一種工業地域	黄	60/200/-
第二種工業地域	黄	60/200/-
第三種工業地域	黄	60/200/-

●: [基幹事業] 1-A-2 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 (H24-H25)
